

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 32852

Rilasciato il 19-07-2016

Scadenza il 19-07-2026

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: VIA PANIGARO 7

Comune: Genova

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Tra il 1976 ed il 1985

Zona climatica: D

Superficie utile A_u [m²]: 125,52

Volume lordo V [m³]: 370,91

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0,86

Proprietà:

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione: BOR

Foglio: 65


Mappale: 62

Sub: 11

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale

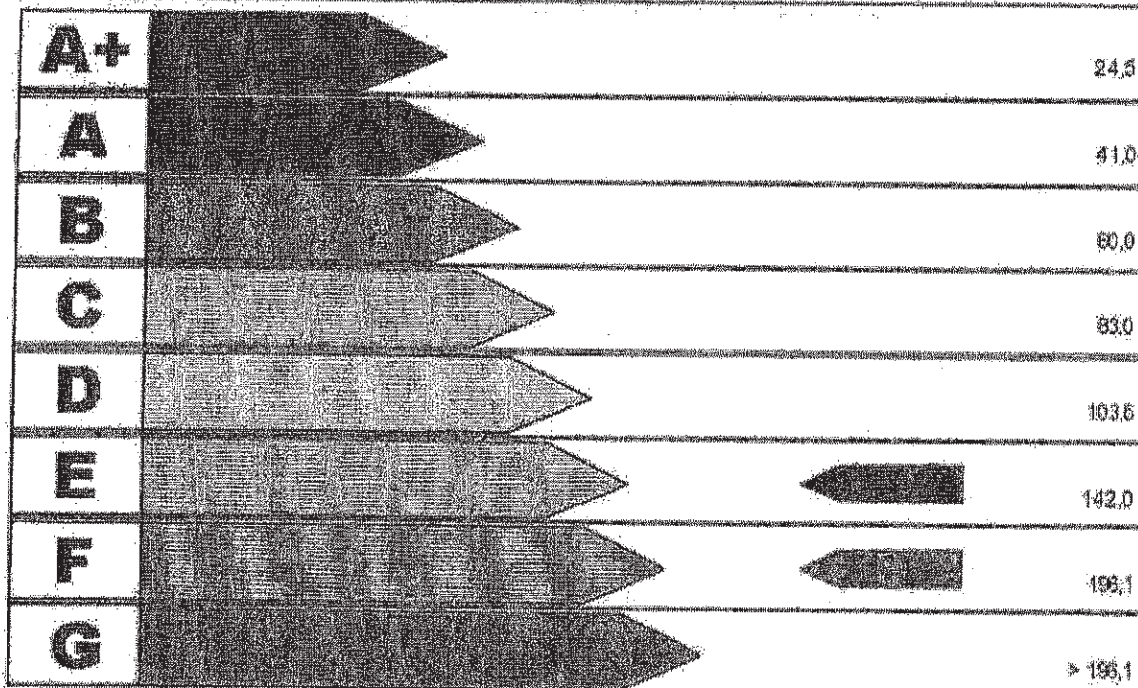

Valore Attuale: 147,21 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 129,55 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio
allo stato attuale: 3,56 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio
con interventi migliorativi: 3,13 t/anno

Fonti rinnovabili

Non utilizzate

Utilizzate

Solare termico

Biomassa

Cogenerazione

Solare fotovoltaico

Pompa di calore




ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 32852

Rilasciato il 19-07-2016

Scadenza il 19-07-2026


Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio

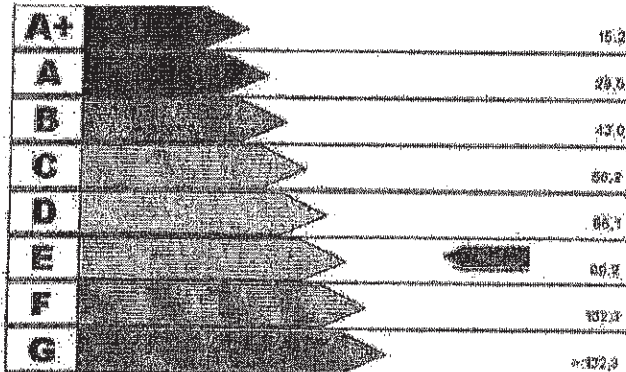

Valore attuale: 93,23 kWh/m² anno
 Valore raggiungibile: 79,74 kWh/m² anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale

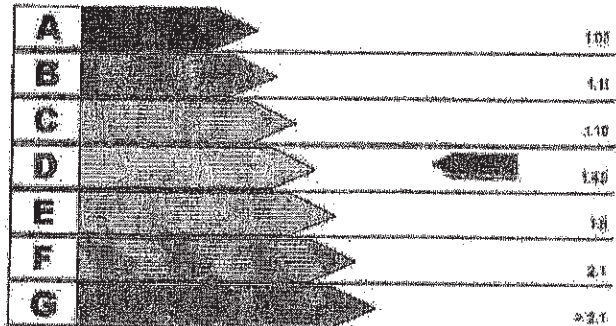

Valore attuale: 1,37
 Valore raggiungibile: 1,38

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 19,09 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 19,23 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{e,ide}: 1716,28 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_l: 0,00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ISOLAMENTO SOLAIO VERSO SOTTOTETTO, CON MATERASSINO IN LANA DI VETRO SP=12CM	17,67	1500,00	10 anni e 1 mese
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo interventi	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovracosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ISOLAMENTO SOLAIO VERSO SOTTOTETTO, CON MATERASSINO IN LANA DI VETRO SP=12CM	17,67	1500,00	10 anni e 1 mese

Tecnico Valerio Giusto

Numero 1106


Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Documento firmato da:
GIUSTO VALERIO
 20/07/2016

Firma, timbro

Dr. Ing. Valerio Giusto
 Elenco Registro Esperti L. 488/99
 Certificatore n° 1106

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta

N. certificatore: 1106
Cognome: Glusto
Nome: Valerio
Anno: 2016
Numero Certificato: 32852
Data Protocollo: 20/07/2016 18:00
Numero Protocollo: PG/2016/0162937

Impronta file .pdf:


c1acc976d3b629f0ea13f4004beee46eebf39b0d2637055b29196177a571d7af

Impronta file .xml:

8b7c65b779ebab604be3b96c67768d15245df5ba1421f355a7d6667435614050



Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore: 1106
Nominativo certificatore: GIUSTO VALERIO
Anno: 2016
Numero certificato: 32852
Codice ordine: 000000248689
UID riscossione: 00202311988117780767
IUV: 000200001598521
Importo totale: 20 €
Data del pagamento: 20/07/2016 17.46

